jueves, 03-07-2025 07:00

Aporte (ton Cu)

Leaching	Q	Cu	Aporte	Neto
Oxido	1097	2,21		58
Sulfuro	3837	1,43		132
Bleed	716	6,68		115
Aporte total	5651	5,40		305
Aporte				

Transferido (ton Cu)

SX-EW	Q	Cu	Neto
Oxido	2399	3,67	202
Sulfuro	3399	1,38	99
Transferido Neto	5798	3,06	301

Piscinas	Inventario m3	PLS %	ILS %	Δ 4 Refino %
Oxido	49957	30,05	39,4	78,8
Sulfuro	331850	72,34	94,5	77,1
Total	386.632	76%		

*Inventario máx. 509.000 m3

Análisis Químico	12:00	18:00	00:00	06:00	día
Piscina					
PLS Ox. Lx	1,98	2,08	2,04	2,04	2,03
Refino Ox Lx	0,35	0,37	0,36	0,35	0,36
PLS Sf Lx	1,26	1,32	1,32	1,32	1,31
Refino Sf Lx	0,23	0,22	0,23	0,23	0,23
Bleed	6,70	6,90	6,65	6,65	6,73
SX					
PLS Ox	3,88	3,86	3,50	3,44	3,67
PLS Sf	1,40	1,42	1,36	1,34	1,38
Ref. Ox	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16
Ref.Sf	0,18	0,17	0,16	0,16	0,17
ILS Ox a pila	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94
ILS SF a pila	2,03	2,03	2,10	2,10	2,06
ILS Ox a pis	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
ILS SF a pis	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68

Flujo agua a refino	69	m3/h

PAD Ox

Cu Refino 0,36

Rec 23-06		Q	Cu	Aporte	M.Módulos en Rampas	ILS Riego	ILS Drenaje
	P01	M001 M003	0	0,58	0,0		
	P02	M003 M004	0	0,76	0,0		
	P03	M005 M006	0	0,73	0,0		
	P04	M007 M008	0	0,70	0,0		
73,1	P05	M009 M010	0	0,67	0,0		
86,4	P06	M011 M012	40	1,10	0,7		
46,1	P07	M013 M014	43	1,36	1,0		
71,3	P08	M015 M016	56	1,60	1,6		
59,7	P09	M017 M018	65	2,06	2,5		
80,2	P10	M019 M020	33	1,86	1,1		
96,4	P11	M021 M022	58	1,72	1,8		
73,4	P12	M023 M024	73	1,24	1,4		
66,4	P13	M025 M026	64	1,44	1,6		
76,3	P14	M027 M028	53	1,56	1,4		
62,0	P15	M029 M030	68	1,34	1,5		
48,0	P16	M031 M032	30	2,06	1,2		
77,4	P17	M033 M034	81	3,14	5,1		
64,6	P18	M035 M036	78	9,20	15,6		
59,1	P19	M037 M038	70	4,10	5,9		
56,9	P20	M039 M040	92	3,34	6,2		
31,9	P21	M041 M042	122	2,44	5,7		
37,2	P22	M043 M044	107	2,56	5,3		
49,3	P23	M045 M046	79	2,66	4,1		
17,7	P24	M047 M048	15	5,60	1,8		
	P25	M049 M050	0	0,71	0,0		
	P26	M051 M052	0	0,93	0,0		
	P27	M053 M054	0	0,65	0,0		
	P28	M055 M056	0	25,60	0,0		
	P29	M057 M058	0	0,74	0,0		
	P30	M059 M060	0	0,64	0,0		
	P31	M061 M062	0	0,54	0,0		
	P32	M063 M064	0	0,58	0,0		

Riego total 1226 — Aporte con refino **65,4**
Riego-hum 1226 — Aporte a ILS **0,0**
Aporte total Ox **65,4**


PAD Sf

Cu Refino 0,23
Cu ILS a pila 2,06

Rec 23-06		Q	Q ILS	Cu	Aporte	%Flujo a Bleed	M.Módulos en Rampas	ILS Riego	ILS Drenaje
24,4	P01	M001 M005	277		5,77	34,6	90		
10,5	P02	M006 M010	326		8,97	64,3	100		
	P03	M011 M015	84		16,40	30,6	100		
	P04	M016 M020	0		0,73	0,0			
	P05	M021 M025	0		0,88	0,0			
	P06	M026 M030	0		0,90	0,0			
	P07	M031 M035	0		1,39	0,0			
	P08	M036 M040	0		1,73	0,0			
	P09	M041 M045	0		2,16	0,0			
	P10	M046 M050	0		1,78	0,0			
	P11	M051 M055	0		1,79	0,0			
	P12	M056 M060	0		1,14	0,0			
94,4	P13	M061 M065	154		0,72	1,7			
71,0	P14	M066 M070	0		0,66	0,0			
67,3	P15	M071 M075	150		1,28	3,6			
70,0	P16	M076 M080	150		1,93	5,8			
73,7	P17	M081 M085	150		1,06	2,8			
74,0	P18	M086 M090	340		1,42	9,1			
65,4	P19	M091 M095	0		1,31	0,0			
74,7	P20	M096 M100	330		1,02	5,9			
55,2	P21	M101 M105	410		1,18	8,8			
63,5	P22	M106 M110	0		0,92	0,0			
49,2	P23	M111 M115	293		1,02	5,2			
65,9	P24	M116 M120	445		1,08	8,6			
45,7	P25	M121 M125	399		2,32	18,8			
59,8	P26	M126 M130	302		1,36	7,7			
51,5	P27	M131 M135	448		1,74	15,3	100		
36,1	P28	M136 M140	293		3,64	21,7	50		

Riego total 4551 0
Riego -hum 4467 — Aporte con refino **244,6**
Riego total - Q ILS 4467 — Aporte a ILS **0,0**
Aporte total SF **244,6**

Flujos de Parcelas Sulfuro (últimos 30 días)

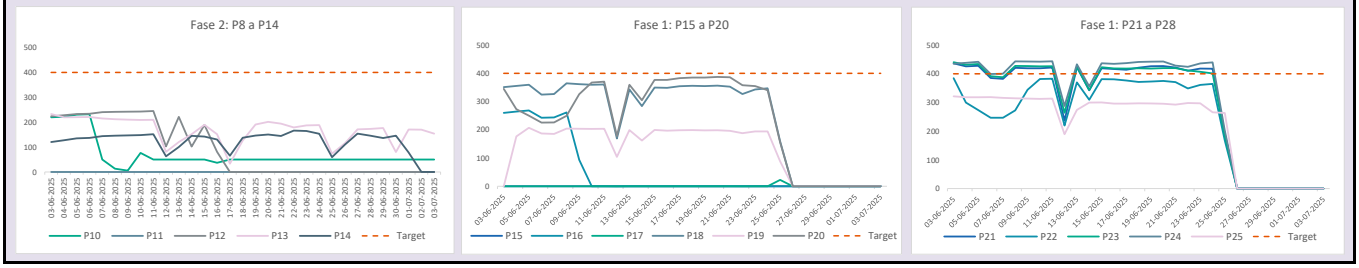

Flujos de Parcelas Oxido (últimos 30 días)

