domingo, 06-07-2025 07:00

Aporte (ton Cu)

Leaching	Q	Cu	Aporte	Neto
Oxido	1144	1,77		49
Sulfuro	3793	1,18		108
Bleed	723	5,13		89
Aporte total	5660	4,34		245
Aporte				

Transferido (ton Cu)

SX-EW	Q	Cu		Neto
Oxido	2399	3,00		165
Sulfuro	3400	1,30		95
Transferido Neto	5799	2,77		260

Δ -15

Piscinas	Inventario m3	PLS %	ILS %	Refino %
Oxido	60994	32,45	59,4	79,1
Sulfuro	286755	70,56	75,4	73,9
Total	353.116	69%		

*Inventario máx. 509.000 m3

Análisis Químico	12:00	18:00	00:00	06:00	día
Piscina					
PLS Ox. Lx	1,79	1,77	1,71	1,77	1,76
Refino Ox Lx	0,19	0,21	0,22	0,17	0,20
PLS Sf Lx	1,12	1,14	1,12	1,12	1,13
Refino Sf Lx	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19
Bleed	5,20	5,15	5,05	5,05	5,11
SX					
PLS Ox	3,18	3,00	2,90	2,90	3,00
PLS Sf	1,31	1,32	1,29	1,29	1,30
Ref. Ox	0,14	0,12	0,12	0,13	0,13
Ref.Sf	0,15	0,14	0,13	0,14	0,14
ILS Ox a pila	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94
ILS SF a pila	1,79	1,79	1,81	1,81	1,80
ILS Ox a pis	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
ILS SF a pis	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68

Flujo agua a refino	91	m3/h

PAD Ox

Cu Refino 0,20

Rec 23-06		Q	Cu	Aporte	M.Módulos en Rampas	ILS Riego	ILS Drenaje
	P01	M001 M003	0	0,58	0,0		
	P02	M003 M004	0	0,76	0,0		
	P03	M005 M006	0	0,73	0,0		
	P04	M007 M008	0	0,70	0,0		
73,1	P05	M009 M010	44	0,67	0,5		
86,4	P06	M011 M012	43	1,02	0,8		
46,1	P07	M013 M014	45	1,30	1,1		
71,3	P08	M015 M016	52	1,56	1,6		
59,7	P09	M017 M018	65	2,02	2,7		
80,2	P10	M019 M020	51	1,82	1,9		
96,4	P11	M021 M022	57	1,78	2,0		
73,4	P12	M023 M024	75	1,22	1,7		
66,4	P13	M025 M026	63	1,40	1,7		
76,3	P14	M027 M028	52	1,54	1,6		
62,0	P15	M029 M030	66	1,32	1,7		
48,0	P16	M031 M032	29	2,02	1,2		
77,4	P17	M033 M034	85	3,06	5,5		
64,6	P18	M035 M036	84	3,40	6,1		
59,1	P19	M037 M038	34	3,88	2,8		
56,9	P20	M039 M040	88	3,18	5,9		
31,9	P21	M041 M042	116	2,16	5,2		
37,2	P22	M043 M044	106	2,28	5,0		
49,3	P23	M045 M046	81	2,62	4,4		
17,7	P24	M047 M048	15	5,26	1,7		
	P25	M049 M050	0	0,71	0,0		
	P26	M051 M052	0	0,93	0,0		
	P27	M053 M054	0	0,65	0,0		
	P28	M055 M056	0	25,60	0,0		
	P29	M057 M058	0	0,74	0,0		
	P30	M059 M060	0	0,64	0,0		
	P31	M061 M062	0	0,54	0,0		
	P32	M063 M064	0	0,58	0,0		

Riego total 1252 — Aporte con refino **55,0**

Riego-hum 1252 — Aporte a ILS **0,0**

Aporte total Ox **55,0**

PAD Sf

Cu Refino 0,19

Cu ILS a pila 1,80

Rec 23-06		Q	Q ILS	Cu	Aporte	%Flujo x Bleed	M.Módulos en Rampas	ILS Riego	ILS Drenaje
24,4	P01	M001 M005	285		4,70	29,0	90		
10,5	P02	M006 M010	339		6,25	46,3	100		
	P03	M011 M015	87		11,40	22,1	100		
	P04	M016 M020	0		0,73	0,0			
	P05	M021 M025	0		0,88	0,0			
	P06	M026 M030	0		0,90	0,0			
	P07	M031 M035	0		1,39	0,0			
	P08	M036 M040	0		1,73	0,0			
	P09	M041 M045	0		2,16	0,0			
	P10	M046 M050	0		1,78	0,0			
	P11	M051 M055	0		1,79	0,0			
	P12	M056 M060	0		1,14	0,0			
94,4	P13	M061 M065	0		0,72	0,0			
71,0	P14	M066 M070	0		0,66	0,0			
67,3	P15	M071 M075	171		1,04	1,6			
70,0	P16	M076 M080	150		0,94	1,3			
73,7	P17	M081 M085	146		0,98	2,6			
74,0	P18	M086 M090	354		1,30	8,9			
65,4	P19	M091 M095	202		0,82	2,9			
74,7	P20	M096 M100	339		1,00	3,1			
55,2	P21	M101 M105	397		1,10	8,1			
63,5	P22	M106 M110	0		0,92	0,0			
49,2	P23	M111 M115	386		1,00	7,0			
65,9	P24	M116 M120	449		1,00	8,2			
45,7	P25	M121 M125	299		1,80	10,8			
59,8	P26	M126 M130	400		1,18	8,9			
51,5	P27	M131 M135	481		1,40	13,1	100		
36,1	P28	M136 M140	272		2,98	17,1	50		


Riego total 4757 — 0

Riego -hum 4669 — Aporte con refino **191,0**

Riego total - Q ILS 4669 — Aporte a ILS **0,0**

Aporte total SF **191,0**

Flujos de Parcelas Sulfuro (últimos 30 días)

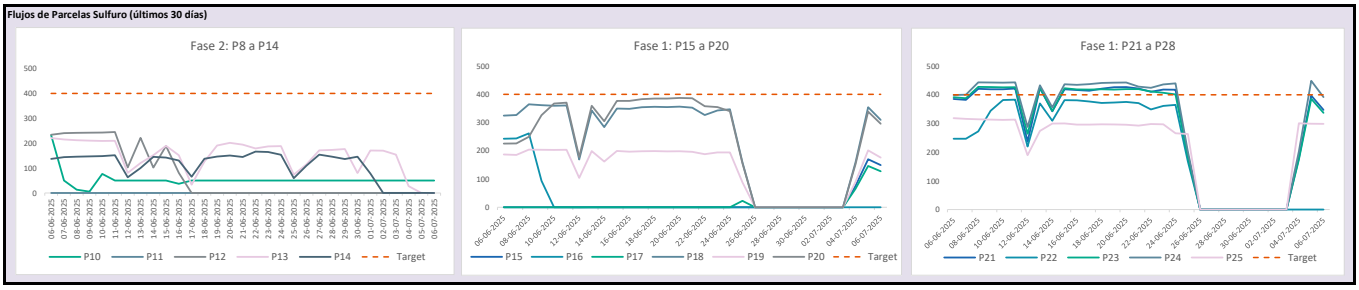

Flujos de Parcelas Oxido (últimos 30 días)

