miércoles, 09-07-2025 07:00

Aporte (ton Cu)

Leaching	Q	Cu	Aporte	Neto
Oxido	1190	1,65		47
Sulfuro	3836	1,05		97
Bleed	711	3,92		67
Aporte total	5737	3,68		211
Aporte				

Transferido (ton Cu)

SX-EW	Q	Cu		Neto
Oxido	2406	2,60		144
Sulfuro	3373	1,15		86
Transferido Neto	5779	2,56		230
			Δ	-19

Piscinas	Inventario m3	PLS %	ILS %	Refino %
Oxido	61055	33,54	62,6	74,1
Sulfuro	280253	70,69	71,6	74,2
Total	347.246	68%		

*Inventario máx. 509.000 m3

Análisis Químico	12:00	18:00	00:00	06:00	día
Piscina					
PLS Ox. Lx	1,63	1,58	1,70	1,95	1,72
Refino Ox Lx	0,16	0,15	0,17	0,16	0,16
PLS Sf Lx	1,07	1,06	1,14	1,14	1,10
Refino Sf Lx	0,31	0,32	0,35	0,38	0,34
Bleed	4,14	4,08	4,36	4,24	4,20
SX					
PLS Ox	2,59	2,55	2,56	2,70	2,60
PLS Sf	1,13	1,15	1,15	1,18	1,15
Ref. Ox	0,10	0,10	0,10	0,11	0,10
Ref.Sf	0,10	0,09	0,10	0,10	0,10
ILS Ox a pila	4,94	4,94	4,76	4,76	4,85
ILS SF a pila	1,87	1,87	1,94	1,94	1,91
ILS Ox a pis	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
ILS SF a pis	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68

Flujo agua a refino: 76 m3/h

PAD Ox

Cu Refino 0,16

Rec 07-07		Q	Cu	Aporte	Módulos en Rampa	ILS Riego	ILS Drenaje
	P01	M001 M002	0	0,58	0,0		
	P02	M003 M004	0	0,76	0,0		
	P03	M005 M006	0	0,73	0,0		
	P04	M007 M008	0	0,70	0,0		
73,2	P05	M009 M010	19	0,65	0,2		
87,1	P06	M011 M012	45	0,85	0,7		
46,7	P07	M013 M014	43	1,12	0,9		
72,8	P08	M015 M016	50	1,27	1,2		
61,8	P09	M017 M018	62	1,82	2,3		
81,6	P10	M019 M020	49	1,60	1,6		
98,3	P11	M021 M022	55	1,49	1,7		
74,7	P12	M023 M024	73	0,99	1,4		
67,6	P13	M025 M026	61	1,20	1,4		
77,4	P14	M027 M028	42	1,39	1,2		
63,1	P15	M029 M030	32	1,15	0,7		
50,3	P16	M031 M032	29	1,82	1,1		
84,5	P17	M033 M034	83	2,40	4,2		
76,5	P18	M035 M036	83	2,50	4,4		
68,1	P19	M037 M038	65	3,16	4,4		
63,8	P20	M039 M040	99	2,44	5,1		
40,8	P21	M041 M042	119	1,15	2,7		
48,1	P22	M043 M044	93	1,66	3,1		
62,0	P23	M045 M046	72	2,02	3,0		
27,7	P24	M047 M048	20	3,96	1,7		
	P25	M049 M050	0	0,71	0,0		
	P26	M051 M052	0	0,93	0,0		
	P27	M053 M054	0	0,65	0,0		
	P28	M055 M056	0	25,60	0,0		
	P29	M057 M058	0	0,74	0,0		
	P30	M059 M060	0	0,64	0,0		
	P31	M061 M062	0	0,54	0,0		
	P32	M063 M064	0	0,58	0,0		

Riego total 1196
Riego-hum 1196

Aporte con refino 43,1
Aporte a ILS 0,0
Aporte total Ox 43,1

PAD Sf


Cu Refino 0,34
Cu ILS a pila 1,91


Rec 07-07		Q	Q ILS	Cu	Aporte	% Riego a Bleed	Módulos en Rampa	ILS Riego	ILS Drenaje
41,5	P01	M001 M005	285		3,83	22,5	90		
40,3	P02	M009 M010	336		4,54	31,8	100		
25,6	P03	M011 M015	89		7,75	13,4	100	2	
	P04	M016 M020	0		0,73	0,0			
	P05	M021 M025	0		0,88	0,0			
	P06	M026 M030	0		0,90	0,0			
	P07	M031 M035	0		1,39	0,0			
	P08	M036 M040	0		1,73	0,0			
	P09	M041 M045	0		2,16	0,0			
	P10	M046 M050	0		1,78	0,0			
	P11	M051 M055	0		1,79	0,0			
	P12	M056 M060	0		1,14	0,0			
94,6	P13	M061 M065	81		0,72	0,7			
71,1	P14	M066 M070	0		0,66	0,0			
67,4	P15	M071 M075	72		0,90	0,9			
70,1	P16	M076 M080	172		0,94	2,3			
74,0	P17	M081 M085	118		0,98	1,7			
75,2	P18	M086 M090	344		1,24	7,0			
65,7	P19	M091 M095	83		0,76	0,8			
75,6	P20	M096 M100	328		0,96	4,6			
56,5	P21	M101 M105	400		1,04	6,3			
64,2	P22	M106 M110	155		1,12	2,7			
50,9	P23	M111 M115	387		0,92	5,1			
67,4	P24	M116 M120	443		0,92	5,8			
47,9	P25	M121 M125	299		1,94	10,8			
64,7	P26	M126 M130	400		1,00	6,0			
57,9	P27	M131 M135	480		1,20	9,3			
43,8	P28	M136 M140	268		2,46	12,8	50		


Riego total 4741 0
Riego -hum 4651
Riego total - Q ILS 4651

Aporte con refino 144,4
Aporte a ILS 0,0
Aporte total SF 144,4

Flujos de Parcelas Sulfuro (últimos 30 días)

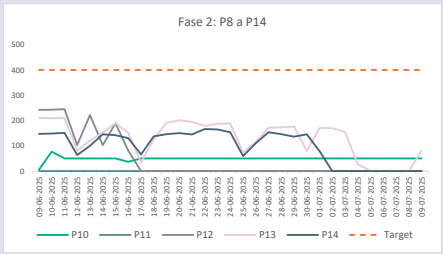

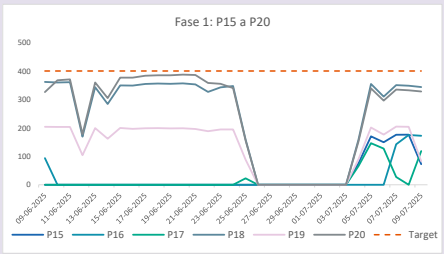

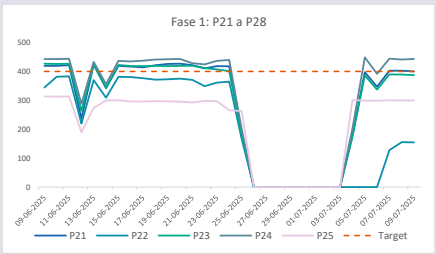

Flujos de Parcelas Oxido (últimos 30 días)

