jueves, 17-07-2025 07:00

Aporte (ton Cu)

Leaching	Q	Cu	Aporte	Neto
Oxido	1077	1,41		36
Sulfuro	3871	1,08		100
Bleed	694	2,72		45
Aporte total	5642	3,22		**182**
Aporte				

Transferido (ton Cu)

SX-EW	Q	Cu		Neto
Oxido	2422	1,97		111
Sulfuro	3400	1,03		79
Transferido Neto	5822	2,26		**190**

Piscinas	Inventario m3	PLS %	Δ ILS %	-8 Refino %
Oxido	52949	32,86	45,2	75,9
Sulfuro	299671	69,14	83,6	74,6
Total	354.520	70%		

*Inventario máx. 509.000 m3

Análisis Químico	12:00	18:00	00:00	06:00	día
Piscina					
PLS Ox. Lx	1,42	1,41	1,40	1,37	1,40
Refino Ox Lx	0,16	0,17	0,17	0,15	0,16
PLS Sf Lx	1,03	1,02	1,01	1,00	1,01
Refino Sf Lx	0,12	0,12	0,11	0,11	0,11
Bleed	2,82	2,74	2,67	2,64	2,72
SX					
PLS Ox	2,02	2,02	1,92	1,91	1,97
PLS Sf	1,07	1,01	1,04	1,02	1,03
Ref. Ox	0,07	0,07	0,06	0,06	0,07
Ref.Sf	0,07	0,07	0,06	0,06	0,07
ILS Ox a pila	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
ILS SF a pila	1,86	1,86	1,79	1,79	1,82
ILS Ox a pis	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
ILS SF a pis	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68

Flujo agua a refino	130	m3/h

PAD Ox

Cu Refino 0,16

Rec.14-07			Q	Cu	Aporte	M.Módulos en Rampas	ILS Riego	ILS Drenaje
	P01	M001 M003	0	0,58	0,0			
	P02	M004 M006	0	0,76	0,0			
	P03	M005 M006	0	0,73	0,0			
	P04	M007 M008	0	0,70	0,0			
73,3	P05	M009 M010	0	0,65	0,0			
87,5	P06	M011 M012	44	0,87	0,7			
47,0	P07	M013 M014	37	1,01	0,7			
73,5	P08	M015 M016	47	1,08	1,0			
62,8	P09	M017 M018	57	1,71	2,0			
82,4	P10	M019 M020	44	1,43	1,3			
99,2	P11	M021 M022	50	1,41	1,4			
75,4	P12	M023 M024	71	0,82	1,0			
68,2	P13	M025 M026	56	1,02	1,1			
77,9	P14	M027 M028	45	1,23	1,1			
63,7	P15	M029 M030	59	0,98	1,1			
51,5	P16	M031 M032	26	1,69	0,9			
87,0	P17	M033 M034	93	2,16	4,2			
81,9	P18	M035 M036	88	2,40	4,5			
71,8	P19	M037 M038	99	3,00	6,4			
67,5	P20	M039 M040	104	2,24	4,9			
43,8	P21	M041 M042	126	1,25	3,1			
50,9	P22	M043 M044	90	1,21	2,1			
67,0	P23	M045 M046	88	1,43	2,5			
31,5	P24	M047 M048	16	2,92	1,0			
	P25	M049 M050	0	0,71	0,0			
	P26	M051 M052	0	0,93	0,0			
	P27	M053 M054	0	0,65	0,0			
	P28	M055 M056	0	25,60	0,0			
	P29	M057 M058	0	0,74	0,0			
	P30	M059 M060	0	0,64	0,0			
	P31	M061 M062	0	0,54	0,0			
	P32	M063 M064	0	0,58	0,0			

Riego total	1240	Aporte con refino	**40,8**
Riego-hum	1240	Aporte a ILS	**0,0**
		Aporte total Ox	**40,8**


PAD Sf

Cu Refino 0,11
Cu ILS a pila 1,82

Rec.14-07			Q	Q ILS	Cu	Aporte	%Flujo a Bleed	M.Módulos en Rampas	ILS Riego	ILS Drenaje
44,8	P01	M001 M003	292		2,96	18,8	90			
44,4	P02	M004 M006	356		3,22	25,0	100			
30,1	P03	M005 M006	96		6,25	6,9	100	3		
	P04	M007 M008	5		0,73	0,0		2		
	P05	M009 M010	0		0,88	0,0				
	P06	M011 M012	0		0,90	0,0				
	P07	M013 M014	0		1,39	0,0				
	P08	M015 M016	0		1,73	0,0				
	P09	M017 M018	0		2,16	0,0				
	P10	M019 M020	0		1,78	0,0				
	P11	M021 M022	0		1,79	0,0				
	P12	M023 M024	0		1,14	0,0				
94,7	P13	M025 M026	138		0,70	1,8				
	P14	M027 M028	0		0,66	0,0				
67,3	P15	M029 M030	0		1,00	0,0				
70,1	P16	M031 M032	231		0,96	4,4				
74,2	P17	M033 M034	220		0,97	4,3				
75,9	P18	M035 M036	369		1,24	9,4				
65,8	P19	M037 M038	0		0,82	0,0				
76,0	P20	M039 M040	298		0,95	5,6				
57,1	P21	M041 M042	361		0,99	7,1				
64,5	P22	M043 M044	314		0,99	6,2				
51,5	P23	M045 M046	358		0,89	6,3				
68,1	P24	M047 M048	361		0,86	6,1				
48,9	P25	M049 M050	333		1,81	12,7				
65,9	P26	M051 M052	398		0,91	7,1				
59,6	P27	M053 M054	467		1,02	9,5				
46,1	P28	M055 M056	297		1,75	11,0				

Riego total	4895	0	
Riego -hum	4875	Aporte con refino	**142,1**
Riego total - Q ILS	4875	Aporte a ILS	**0,0**
		Aporte total SF	**142,1**

Flujos de Parcelas Sulfuro (últimos 30 días)

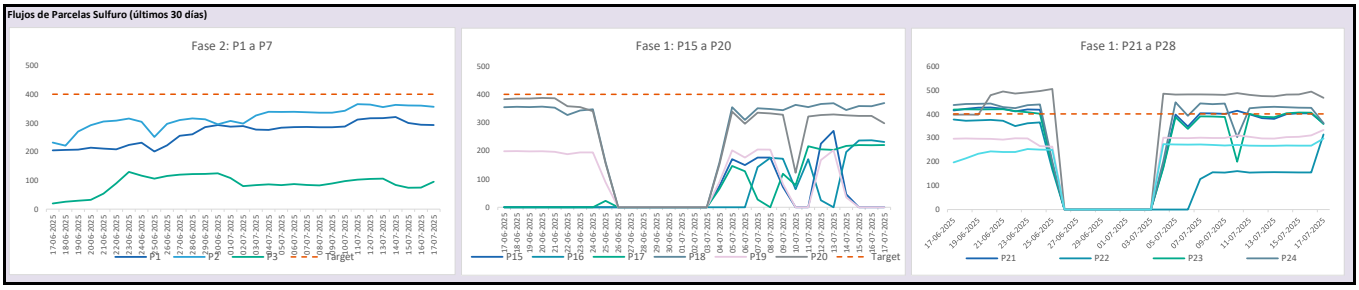

Flujos de Parcelas Oxido (últimos 30 días)

