sábado, 19-07-2025 07:00

Aporte (ton Cu)

Leaching	Q	Cu	Aporte	Neto
Oxido	1054	1,38		35
Sulfuro	3535	1,04		88
Bleed	682	2,45		40
Aporte total	5271	3,10		163
Aporte				

Transferido (ton Cu)

SX-EW	Q	Cu	Neto
Oxido	2564	1,81	108
Sulfuro	3194	0,98	71
Transferido Neto	5758	2,19	179

Δ -15

Piscinas	Inventario m3	PLS %	ILS %	Refino %
Oxido	57639	35,93	48,6	78,5
Sulfuro	293409	66,54	80,5	82,1
Total	354.253	70%		

*Inventario máx. 509.000 m3

Análisis Químico	12:00	18:00	00:00	06:00	día
Piscina					
PLS Ox. Lx	1,30	1,33	1,33	1,32	1,32
Refino Ox Lx	0,10	0,14	0,14	0,15	0,13
PLS Sf Lx	0,97	0,97	0,99	0,97	0,98
Refino Sf Lx	0,13	0,13	0,10	0,11	0,12
Bleed	2,48	2,48	2,45	2,38	2,45
SX					
PLS Ox	1,83	1,81	1,80	1,82	1,81
PLS Sf	1,00	0,99	0,97	0,97	0,98
Ref. Ox	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06
Ref.Sf	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
ILS Ox a pila	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
ILS SF a pila	1,73	1,73	1,70	1,70	1,72
ILS Ox a pis	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
ILS SF a pis	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68

Flujo agua a refino	92	m3/h

PAD Ox

Cu Refino 0,13

Rec. 14-07			Q	Cu	Aporte	Módulos en Rampas	ILS Riego	ILS Drenaje
	P01	M001 M002	0	0,58	0,0			
	P02	M003 M004	0	0,76	0,0			
	P03	M005 M006	0	0,73	0,0			
	P04	M007 M008	0	0,70	0,0			
73,3	P05	M009 M010	0	0,65	0,0			
87,5	P06	M011 M012	47	0,81	0,7			
47,0	P07	M013 M014	35	0,91	0,6			
73,5	P08	M015 M016	43	1,03	0,9			
62,8	P09	M017 M018	55	1,62	1,8			
82,4	P10	M019 M020	42	1,32	1,1			
99,2	P11	M021 M022	47	1,32	1,3			
75,4	P12	M023 M024	66	0,80	1,0			
68,2	P13	M025 M026	53	0,97	1,0			
77,9	P14	M027 M028	43	1,15	1,0			
63,7	P15	M029 M030	56	0,92	1,0			
51,5	P16	M031 M032	25	1,59	0,8			
87,0	P17	M033 M034	87	2,02	3,7			
81,9	P18	M035 M036	85	2,20	4,0			
71,8	P19	M037 M038	89	2,67	5,1			
67,5	P20	M039 M040	109	2,01	4,6			
43,8	P21	M041 M042	121	1,08	2,6			
50,9	P22	M043 M044	89	1,09	1,9			
67,0	P23	M045 M046	73	1,32	1,9			
31,5	P24	M047 M048	13	2,79	0,8			
	P25	M049 M050	0	0,71	0,0			
	P26	M051 M052	0	0,93	0,0			
	P27	M053 M054	0	0,65	0,0			
	P28	M055 M056	0	25,60	0,0			
	P29	M057 M058	0	0,74	0,0			
	P30	M059 M060	0	0,64	0,0			
	P31	M061 M062	0	0,54	0,0			
	P32	M063 M064	0	0,58	0,0			

Riego total 1180 — Aporte con refino **35,9**

Riego-hum 1180 — Aporte a ILS **0,0**

Aporte total Ox **35,9**

PAD Sf

Cu Refino 0,12

Cu ILS a pila 1,72

Rec. 14-07			Q	Q ILS	Cu	Aporte	% Flujo a Bleed	Módulos en Rampas	ILS Riego	ILS Drenaje
44,8	P01	M001 M002	296		2,60	16,6	90			
44,4	P02	M003 M004	355		2,86	21,9	100			
30,1	P03	M005 M006	106		5,60	8,0	100	3		
	P04	M007 M008	5		0,73	0,0		2		
	P05	M009 M010	0		0,88	0,0				
	P06	M011 M012	0		0,90	0,0				
	P07	M013 M014	0		1,39	0,0				
	P08	M015 M016	0		1,73	0,0				
	P09	M017 M018	0		2,16	0,0				
	P10	M019 M020	0		1,78	0,0				
	P11	M021 M022	0		1,79	0,0				
	P12	M023 M024	0		1,14	0,0				
94,7	P13	M025 M026	132		0,62	1,5				
	P14	M027 M028	0		0,66	0,0				
67,3	P15	M029 M030	148		1,00	1,5				
70,1	P16	M031 M032	237		0,93	4,3				
74,2	P17	M033 M034	218		0,92	3,9				
75,9	P18	M035 M036	386		1,22	9,6				
65,8	P19	M037 M038	153		0,82	1,2				
76,0	P20	M039 M040	298		0,91	5,3				
57,1	P21	M041 M042	347		0,94	6,4				
64,5	P22	M043 M044	368		1,04	7,7				
51,5	P23	M045 M046	0		0,85	0,0				
68,1	P24	M047 M048	0		0,84	0,0				
48,9	P25	M049 M050	363		1,80	13,8				
65,9	P26	M051 M052	350		0,94	6,5				
59,6	P27	M053 M054	398		1,04	8,3				
46,1	P28	M055 M056	271		1,84	10,5				


Riego total 4431 — 0

Riego -hum 4385 — Aporte con refino **127,2**

Riego total - Q ILS 4385 — Aporte a ILS **0,0**

Aporte total SF **127,2**

Flujos de Parcelas Sulfuro (últimos 30 días)

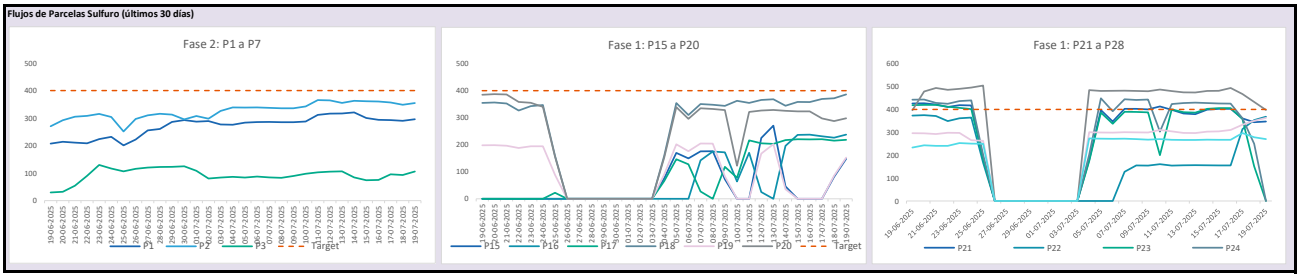

Flujos de Parcelas Oxido (últimos 30 días)

