lunes, 21-07-2025 07:00

Aporte (ton Cu)

Leaching	Q	Cu	Aporte	Neto
Oxido	1093	1,24		33
Sulfuro	3705	1,02		90
Bleed	672	2,25		36
Aporte total	5469	2,91		**159**
Aporte				

Transferido (ton Cu)

SX-EW	Q	Cu	Neto
Oxido	2602	1,73	105
Sulfuro	3280	1,01	74
Transferido Neto	5881	2,17	**179**

Δ -20

Piscinas	Inventario m3	PLS %	ILS %	Refino %
Oxido	54702	30,08	49,6	79,0
Sulfuro	264569	65,11	71,1	73,5
Total	339.753	67%		

*Inventario máx. 509.000 m3

Análisis Químico	12:00	18:00	00:00	06:00	día
Piscina					
PLS Ox. Lx	1,32	1,30	1,29	1,26	1,29
Refino Ox Lx	0,14	0,18	0,18	0,14	0,16
PLS Sf Lx	1,01	1,01	0,99	0,95	0,99
Refino Sf Lx	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Bleed	2,42	2,42	2,32	2,27	2,36
SX					
PLS Ox	1,81	1,74	1,70	1,66	1,73
PLS Sf	1,02	1,02	1,01	0,98	1,01
Ref. Ox	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Ref.Sf	0,06	0,06	0,06	0,07	0,06
ILS Ox a pila	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
ILS SF a pila	1,61	1,61	1,57	1,57	1,59
ILS Ox a pis	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
ILS SF a pis	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68

Flujo agua a refino	150	m3/h

PAD Ox

Cu Refino 0,16

		Rec. 14-07	Q	Cu	Aporte	Módulos en Rampas	ILS Riego	ILS Drenaje
P01	M001 M002		0	0,58	0,0			
P02	M003 M004		0	0,76	0,0			
P03	M005 M006		0	0,73	0,0			
P04	M007 M008		0	0,70	0,0			
P05	M009 M010	73,3	0	0,65	0,0			
P06	M011 M012	87,5	49	0,81	0,7			
P07	M013 M014	47,0	38	0,89	0,6			
P08	M015 M016	73,5	46	1,03	0,9			
P09	M017 M018	62,8	58	1,60	1,9			
P10	M019 M020	82,4	45	1,38	1,2			
P11	M021 M022	99,2	51	1,32	1,3			
P12	M023 M024	75,4	71	0,84	1,1			
P13	M025 M026	68,2	56	0,98	1,0			
P14	M027 M028	77,9	53	1,15	1,2			
P15	M029 M030	63,7	61	0,92	1,0			
P16	M031 M032	51,5	28	1,61	0,9			
P17	M033 M034	87,0	95	2,10	4,2			
P18	M035 M036	81,9	87	2,15	3,9			
P19	M037 M038	71,8	92	2,49	4,8			
P20	M039 M040	67,5	112	1,96	4,6			
P21	M041 M042	43,8	128	1,05	2,6			
P22	M043 M044	50,9	92	1,06	1,9			
P23	M045 M046	67,0	86	1,28	2,2			
P24	M047 M048	31,5	15	2,80	0,9			
P25	M049 M050		0	0,71	0,0			
P26	M051 M052		0	0,93	0,0			
P27	M053 M054		0	0,65	0,0			
P28	M055 M056		0	25,60	0,0			
P29	M057 M058		0	0,74	0,0			
P30	M059 M060		0	0,64	0,0			
P31	M061 M062		0	0,54	0,0			
P32	M063 M064		0	0,58	0,0			

Riego total 1263 — Aporte con refino **36,9**

Riego-hum 1263 — Aporte a ILS **0,0**

Aporte total Ox **36,9**

PAD Sf

Cu Refino 0,11

Cu ILS a pila 1,59

		Rec. 14-07	Q	Q ILS	Cu	Aporte	% Flujo a Bleed	Módulos en Rampas	ILS Riego	ILS Drenaje
P01	M001 M002	44,8	304		2,30	15,0	90			
P02	M003 M004	44,4	364		2,54	19,9	100			
P03	M005 M006	30,1	98		4,53	6,5	100	3		
P04	M007 M008		9		0,73	0,0		4		
P05	M009 M010		0		0,88	0,0				
P06	M011 M012		0		0,90	0,0				
P07	M013 M014		0		1,39	0,0				
P08	M015 M016		0		1,73	0,0				
P09	M017 M018		0		2,16	0,0				
P10	M019 M020		0		1,78	0,0				
P11	M021 M022		0		1,79	0,0				
P12	M023 M024		0		1,14	0,0				
P13	M025 M026	94,7	158		0,60	1,7				
P14	M027 M028		0		0,66	0,0				
P15	M029 M030	67,3	158		0,80	2,5				
P16	M031 M032	70,1	239		0,84	3,9				
P17	M033 M034	74,2	230		0,85	3,8				
P18	M035 M036	75,9	387		1,18	9,3				
P19	M037 M038	65,8	160		0,55	1,6				
P20	M039 M040	76,0	299		0,87	5,1				
P21	M041 M042	57,1	228		0,88	4,0				
P22	M043 M044	64,5	369		0,93	6,8				
P23	M045 M046	51,5	0		0,85	0,0				
P24	M047 M048	68,1	344		0,94	6,4				
P25	M049 M050	48,9	387		1,87	15,4				
P26	M051 M052	65,9	350		0,85	5,8				
P27	M053 M054	59,6	406		0,99	8,1				
P28	M055 M056	46,1	277		1,53	8,9				


Riego total 4768 — 0


Riego -hum 4726 — Aporte con refino **124,9**


Riego total - Q ILS 4726 — Aporte a ILS **0,0**

Aporte total SF **124,9**

Flujos de Parcelas Sulfuro (últimos 30 días)

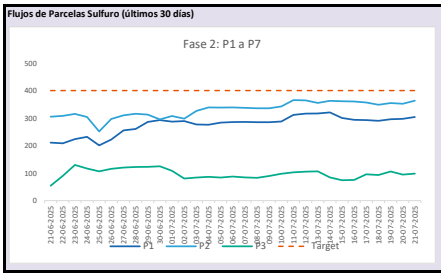



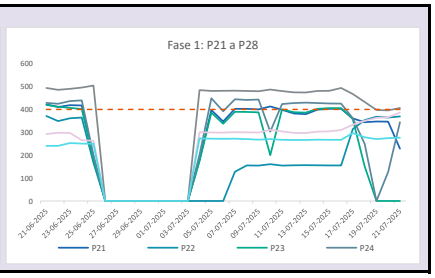

Flujos de Parcelas Oxido (últimos 30 días)

