viernes, 25-07-2025 07:00

Aporte (ton Cu)

Leaching	Q	Cu	Aporte	Neto
Oxido	1315	1,24		39
Sulfuro	3241	0,91		71
Bleed	651	1,96		31
Aporte total	5207	2,70		**141**
Aporte				

Transferido (ton Cu)

SX-EW	Q	Cu		Neto
Oxido	2571	1,57		91
Sulfuro	2591	0,95		56
Transferido Neto	5162	2,08		**147**
			Δ	-6

Piscinas	Inventario m3	PLS %	ILS %	Refino %
Oxido	53964	32,02	39,7	84,6
Sulfuro	264484	71,41	61,4	76,0
Total	339.647	67%		

*Inventario máx. 509.000 m3

Análisis Químico	12:00	18:00	00:00	06:00	día
Piscina					
PLS Ox. Lx	1,18	1,38	1,38	1,37	1,33
Refino Ox Lx	0,35	0,38	0,34	0,35	0,35
PLS Sf Lx	0,93	0,97	0,93	0,89	0,93
Refino Sf Lx	0,13	0,13	0,22	0,22	0,17
Bleed	2,10	2,20	2,11	2,13	2,13
SX					
PLS Ox	1,60	1,56	1,52	1,59	1,57
PLS Sf	0,96	0,95	0,96	0,95	0,95
Ref. Ox	0,15	0,12	0,06	0,06	0,10
Ref.Sf	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
ILS Ox a pila	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
ILS SF a pila	1,42	1,42	1,39	1,39	1,40
ILS Ox a pis	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
ILS SF a pis	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68

Flujo agua a refino	39	m3/h

PAD Ox

Cu Refino 0,35

		Rec 14-07	Q	Cu	Aporte	Módulos en Rampak	ILS Riego	ILS Drenaje
P01	M001 M002		0	0,58	0,0			
P02	M003 M004		0	0,76	0,0			
P03	M005 M006		0	0,73	0,0			
P04	M007 M008		0	0,70	0,0			
P05	M009 M010	73,3	0	0,65	0,0			
P06	M011 M012	87,5	47	0,83	0,5			
P07	M013 M014	47,0	36	0,80	0,4			
P08	M015 M016	73,5	45	0,96	0,6			
P09	M017 M018	62,8	56	1,60	1,6			
P10	M019 M020	82,4	43	1,36	1,0			
P11	M021 M022	99,2	58	1,24	1,2			
P12	M023 M024	75,4	72	0,78	0,7			
P13	M025 M026	68,2	54	0,92	0,7			
P14	M027 M028	77,9	43	1,10	0,7			
P15	M029 M030	63,7	58	0,84	0,6			
P16	M031 M032	51,5	26	1,55	0,7			
P17	M033 M034	87,0	93	1,90	3,3			
P18	M035 M036	81,9	107	1,70	3,3			
P19	M037 M038	71,8	92	2,29	4,0			
P20	M039 M040	67,5	111	1,69	3,3			
P21	M041 M042	43,8	123	0,90	1,5			
P22	M043 M044	50,9	92	0,92	1,2			
P23	M045 M046	67,0	77	1,26	1,6			
P24	M047 M048	31,5	14	2,65	0,7			
P25	M049 M050		0	0,71	0,0			
P26	M051 M052		0	0,93	0,0			
P27	M053 M054		0	0,65	0,0			
P28	M055 M056		0	25,60	0,0			
P29	M057 M058		0	0,74	0,0			
P30	M059 M060		0	0,64	0,0			
P31	M061 M062		0	0,54	0,0			
P32	M063 M064		0	0,58	0,0			

Riego total	1250	Aporte con refino	**27,5**
Riego-hum	1250	Aporte a ILS	**0,0**
		Aporte total Ox	**27,5**


PAD Sf


Cu Refino 0,17
Cu ILS a pila 1,40


		Rec 14-07	Q	Q ILS	Cu	Aporte	% Riego a Bleed	Módulos en Rampak	ILS Riego	ILS Drenaje
P01	M001 M005	44,8	289		1,98	11,8	90			
P02	M009 M010	44,4	347		2,10	15,1	100			
P03	M011 M015	30,1	109		3,28	1,8	100	3		
P04	M016 M020		24		0,73	0,0		5		
P05	M021 M025		0		0,88	0,0				
P06	M026 M030		0		0,90	0,0				
P07	M031 M035		0		1,39	0,0				
P08	M036 M040		0		1,73	0,0				
P09	M041 M045		0		2,16	0,0				
P10	M046 M050		0		1,78	0,0				
P11	M051 M055		0		1,79	0,0				
P12	M056 M060		0		1,14	0,0				
P13	M061 M065	94,7	155		0,60	1,5				
P14	M066 M070		0		0,66	0,0				
P15	M071 M075	67,3	0		0,70	0,0				
P16	M076 M080	70,1	0		0,74	0,0				
P17	M081 M085	74,2	0		0,73	0,0				
P18	M086 M090	75,9	380		1,10	7,9				
P19	M091 M095	65,8	0		0,76	0,0				
P20	M096 M100	76,0	244		0,89	3,9				
P21	M101 M105	57,1	165		0,94	2,8				
P22	M106 M110	64,5	363		0,84	5,4				
P23	M111 M115	51,5	0		0,85	0,0				
P24	M116 M120	68,1	337		0,86	5,2				
P25	M121 M125	48,9	383		1,81	14,1				
P26	M126 M130	65,9	400		0,80	5,6				
P27	M131 M135	59,6	396		0,92	6,7				
P28	M136 M140	46,1	262		1,76	9,4				

Riego total	3855	0	
Riego -hum	3787	Aporte con refino	**91,3**
Riego total - Q ILS	3787	Aporte a ILS	**0,0**
		Aporte total SF	**91,3**

Flujos de Parcelas Sulfuro (últimos 30 días)

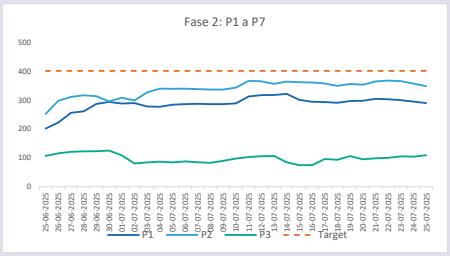

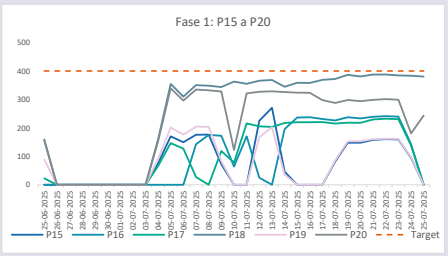

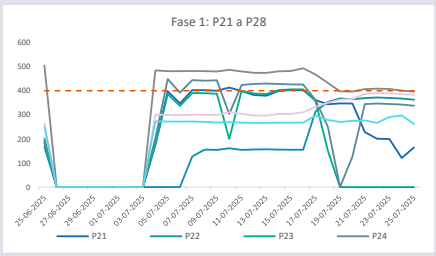

Flujos de Parcelas Oxido (últimos 30 días)

