sábado, 26-07-2025 07:00

Aporte (ton Cu)

Leaching	Q	Cu	Aporte	Neto
Oxido	1267	1,26		38
Sulfuro	3851	0,94		87
Bleed	681	1,97		32
Aporte total	5799	2,71		157
Aporte				

Transferido (ton Cu)

SX-EW	Q	Cu		Neto
Oxido	2601	1,64		98
Sulfuro	3280	0,99		74
Transferido Neto	5881	2,12		172
			Δ	-15

Piscinas	Inventario m3	PLS %	ILS %	Refino %
Oxido	54992	33,31	43,6	81,4
Sulfuro	253122	65,89	63,3	74,9
Total	328.951	65%		

*Inventario máx. 509.000 m3

Análisis Químico	12:00	18:00	00:00	06:00	día
Piscina					
PLS Ox. Lx	1,36	1,43	1,21	1,22	1,31
Refino Ox Lx	0,14	0,14	0,11	0,12	0,13
PLS Sf Lx	0,92	0,95	0,90	0,93	0,92
Refino Sf Lx	0,12	0,10	0,09	0,09	0,10
Bleed	2,01	2,13	2,03	2,13	2,08
SX					
PLS Ox	1,74	1,60	1,59	1,61	1,64
PLS Sf	1,00	0,99	0,99	0,98	0,99
Ref. Ox	0,06	0,07	0,05	0,06	0,06
Ref.Sf	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
ILS Ox a pila	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
ILS SF a pila	1,40	1,40	1,43	1,43	1,41
ILS Ox a pis	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
ILS SF a pis	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68

Flujo agua a refino	121	m3/h

PAD Ox

Cu Refino 0,13

Rec 21-07		Q	Cu	Aporte	Módulos en Rampa	ILS Riego	ILS Drenaje
	P01	M001 M002	0	0,58	0,0		
	P02	M003 M004	0	0,76	0,0		
	P03	M005 M006	0	0,73	0,0		
	P04	M007 M008	0	0,70	0,0		
	P05	M009 M010	0	0,65	0,0		
88,0	P06	M011 M012	48	0,80	0,7		
47,3	P07	M013 M014	37	0,81	0,6		
74,0	P08	M015 M016	46	0,93	0,8		
63,7	P09	M017 M018	58	1,50	1,8		
83,2	P10	M019 M020	44	1,25	1,1		
99,9	P11	M021 M022	51	1,18	1,2		
75,9	P12	M023 M024	71	0,71	0,9		
68,6	P13	M025 M026	56	0,88	0,9		
78,4	P14	M027 M028	45	1,06	0,9		
64,1	P15	M029 M030	60	0,84	1,0		
52,5	P16	M031 M032	27	1,46	0,8		
89,5	P17	M033 M034	95	1,87	3,7		
82,4	P18	M035 M036	86	1,70	3,0		
75,2	P19	M037 M038	89	2,18	4,1		
70,3	P20	M039 M040	112	1,68	3,9		
46,1	P21	M041 M042	127	0,90	2,2		
52,8	P22	M043 M044	95	0,92	1,7		
69,7	P23	M045 M046	86	1,04	1,8		
33,7	P24	M047 M048	15	2,20	0,7		
	P25	M049 M050	0	0,71	0,0		
	P26	M051 M052	0	0,93	0,0		
	P27	M053 M054	0	0,65	0,0		
	P28	M055 M056	0	25,60	0,0		
	P29	M057 M058	0	0,74	0,0		
	P30	M059 M060	0	0,64	0,0		
	P31	M061 M062	0	0,54	0,0		
	P32	M063 M064	0	0,58	0,0		

Riego total	1249	Aporte con refino	32,1
Riego-hum	1249	Aporte a ILS	0,0
		Aporte total Ox	32,1


PAD Sf


Cu Refino 0,10
Cu ILS a pila 1,41


Rec 21-07		Q	Q ILS	Cu	Aporte	% Riego a Bleed	Módulos en Rampa	ILS Riego	ILS Drenaje
47,4	P01	M001 M005	299		2,05	13,1	90		
47,7	P02	M009 M010	364		2,27	17,8	100		
33,8	P03	M011 M015	105		4,56	6,5	100	3	
	P04	M016 M020	20		0,73	0,0		5	
	P05	M021 M025	0		0,88	0,0			
	P06	M026 M030	0		0,90	0,0			
	P07	M031 M035	0		1,39	0,0			
	P08	M036 M040	0		1,73	0,0			
	P09	M041 M045	0		2,16	0,0			
	P10	M046 M050	0		1,78	0,0			
	P11	M051 M055	0		1,79	0,0			
	P12	M056 M060	0		1,14	0,0			
94,9	P13	M061 M065	166		0,60	1,9			
	P14	M066 M070	0		0,66	0,0			
67,4	P15	M071 M075	160		0,75	2,3			
70,3	P16	M076 M080	239		0,78	3,7			
74,6	P17	M081 M085	231		0,82	3,8			
76,6	P18	M086 M090	384		1,15	9,1			
65,9	P19	M091 M095	161		0,78	2,5			
76,4	P20	M096 M100	299		0,89	5,3			
57,7	P21	M101 M105	199		0,94	3,8			
65,2	P22	M106 M110	370		0,84	6,2			
51,9	P23	M111 M115	0		0,85	0,0			
68,6	P24	M116 M120	345		0,86	5,9			
50,1	P25	M121 M125	389		1,81	15,0			
67,2	P26	M126 M130	400		0,80	6,3			
61,3	P27	M131 M135	407		0,92	7,5			
48,1	P28	M136 M140	290		1,76	10,9			

Riego total	4828	0	
Riego -hum	4769	Aporte con refino	121,7
Riego total - Q ILS	4769	Aporte a ILS	0,0
		Aporte total SF	121,7

Flujos de Parcelas Sulfuro (últimos 30 días)

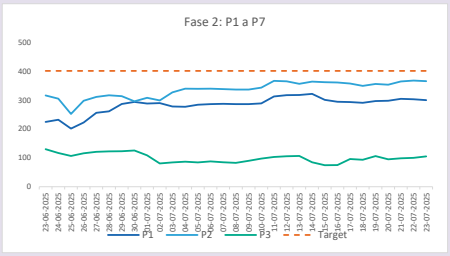

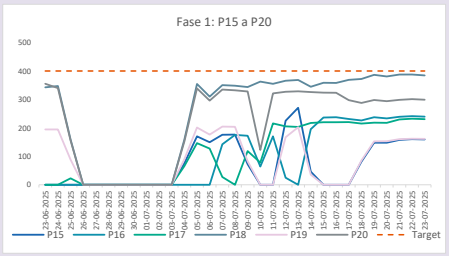

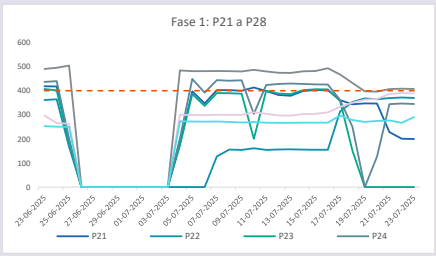

Flujos de Parcelas Oxido (últimos 30 días)

