lunes, 28-07-2025 07:00

Leaching

Aporte (ton Cu)

	Q	Cu	Aporte	Neto
Oxido	1191	1,17		33
Sulfuro	3689	0,91		80
Bleed	683	2,07		34
Aporte total	5562	2,65		148
Aporte				

SX-EW

Transferido (ton Cu)

	Q	Cu	Neto
Oxido	2361	1,54	84
Sulfuro	3280	0,95	70
Transferido Neto	5641	2,04	154

Δ -7

Piscinas

	Inventario m3	PLS %	ILS %	Refino %
Oxido	53172	31,61	25,5	95,5
Sulfuro	238348	61,13	63,9	70,1
Total	311.540	61%		

*Inventario máx. 509.000 m3

Análisis Químico

	12:00	18:00	00:00	06:00	día
Piscina					
PLS Ox. Lx	1,35	1,20	1,17	1,15	1,22
Refino Ox Lx	0,11	0,11	0,12	0,12	0,11
PLS Sf Lx	0,91	0,90	0,90	0,89	0,90
Refino Sf Lx	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11
Bleed	2,14	2,13	2,21	2,20	2,17
SX					
PLS Ox	1,55	1,54	1,54	1,52	1,54
PLS Sf	0,99	0,94	0,94	0,91	0,95
Ref. Ox	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06
Ref.Sf	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
ILS Ox a pila	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
ILS SF a pila	1,36	1,36	1,35	1,35	1,36
ILS Ox a pis	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
ILS SF a pis	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68

Flujo agua a refino 79 m3/h

PAD Ox

Cu Refino 0,11

Rec 21-07		Q	Cu	Aporte	Módulos en Rampa	ILS Riego	ILS Drenaje
	P01	M001 M002	0	0,58	0,0		
	P02	M003 M004	0	0,76	0,0		
	P03	M005 M006	0	0,73	0,0		
	P04	M007 M008	0	0,70	0,0		
	P05	M009 M010	0	0,65	0,0		
88,0	P06	M011 M012	47	0,79	0,7		
47,3	P07	M013 M014	37	0,82	0,6		
74,0	P08	M015 M016	45	0,94	0,8		
63,7	P09	M017 M018	57	1,62	1,9		
83,2	P10	M019 M020	43	1,27	1,1		
99,9	P11	M021 M022	55	1,26	1,4		
75,9	P12	M023 M024	73	0,81	1,1		
68,6	P13	M025 M026	55	0,94	1,0		
78,4	P14	M027 M028	44	0,93	0,8		
64,1	P15	M029 M030	59	0,86	1,0		
52,5	P16	M031 M032	27	1,55	0,9		
89,5	P17	M033 M034	94	1,84	3,6		
82,4	P18	M035 M036	91	1,70	3,2		
75,2	P19	M037 M038	91	2,30	4,5		
70,3	P20	M039 M040	111	1,60	3,7		
46,1	P21	M041 M042	129	0,86	2,2		
52,8	P22	M043 M044	89	0,95	1,7		
69,7	P23	M045 M046	77	1,40	2,2		
33,7	P24	M047 M048	14	2,25	0,7		
	P25	M049 M050	3	0,71	0,0		
	P26	M051 M052	0	0,93	0,0		
	P27	M053 M054	0	0,65	0,0		
	P28	M055 M056	0	25,60	0,0		
	P29	M057 M058	0	0,74	0,0		
	P30	M059 M060	0	0,64	0,0		
	P31	M061 M062	0	0,54	0,0		
	P32	M063 M064	0	0,58	0,0		

Riego total 1241
Riego-hum 1241

Aporte con refino 33,3
Aporte a ILS 0,0
Aporte total Ox 33,3

PAD Sf


Cu Refino 0,11
Cu ILS a pila 1,36


Rec 21-07		Q	Q ILS	Cu	Aporte	% Riego a Bleed	Módulos en Rampa	ILS Riego	ILS Drenaje
47,4	P01	M001 M005	312		1,80	11,9	90		
47,7	P02	M009 M010	357		1,89	14,4	100		
33,8	P03	M011 M015	65		3,40	4,8	100	3	
	P04	M016 M020	38		0,73	0,0		5	
	P05	M021 M025	0		0,88	0,0			
	P06	M026 M030	0		0,90	0,0			
	P07	M031 M035	0		1,39	0,0			
	P08	M036 M040	0		1,73	0,0			
	P09	M041 M045	0		2,16	0,0			
	P10	M046 M050	0		1,78	0,0			
	P11	M051 M055	0		1,79	0,0			
	P12	M056 M060	0		1,14	0,0			
	P13	M061 M065	9		0,60	0,1			
	P14	M066 M070	0		0,66	0,0			
67,4	P15	M071 M075	148		0,80	2,3			
70,3	P16	M076 M080	245		0,71	3,3			
74,6	P17	M081 M085	192		0,76	2,8			
76,6	P18	M086 M090	397		0,98	7,8			
65,9	P19	M091 M095	167		0,51	1,5			
76,4	P20	M096 M100	304		0,76	4,5			
57,7	P21	M101 M105	186		0,95	3,5			
65,2	P22	M106 M110	0		0,96	0,0			
51,9	P23	M111 M115	369		0,85	5,3			
68,6	P24	M116 M120	340		0,72	4,7			
50,1	P25	M121 M125	374		1,56	12,3			
67,2	P26	M126 M130	400		0,69	5,3			
61,3	P27	M131 M135	395		0,81	6,3			
48,1	P28	M136 M140	283		1,38	8,1			


Riego total 4582 0
Riego -hum 4544
Riego total - Q ILS 4544

Aporte con refino 99,1
Aporte a ILS 0,0
Aporte total SF 99,1

Flujos de Parcelas Sulfuro (últimos 30 días)

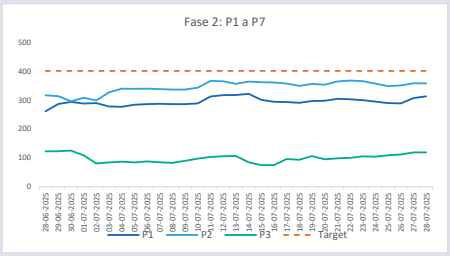

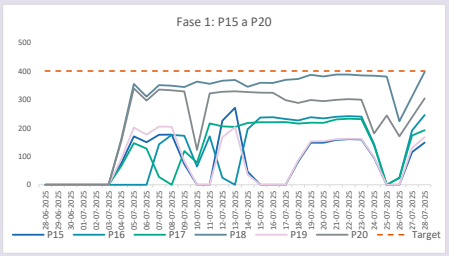

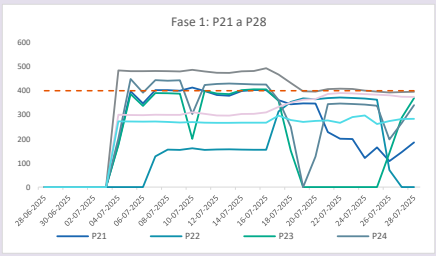

Flujos de Parcelas Oxido (últimos 30 días)

