martes, 29-07-2025 07:00

Aporte (ton Cu)

Leaching	Q	Cu	Aporte	Neto
Oxido	1075	1,08		28
Sulfuro	3747	0,88		80
Bleed	690	2,12		35
Aporte total	5513	2,59		143
Aporte				

Transferido (ton Cu)

SX-EW	Q	Cu	Neto
Oxido	2360	1,53	84
Sulfuro	3280	0,92	68
Transferido Neto	5640	2,02	152

Δ -10

Piscinas	Inventario m3	PLS %	ILS %	Refino %
Oxido	52656	31,11	36,0	86,3
Sulfuro	234580	60,81	64,2	65,7
Total	304.527	60%		

*Inventario máx. 509.000 m3

Análisis Químico	12:00	18:00	00:00	06:00	día
Piscina					
PLS Ox. Lx	1,13	1,14	1,13	1,13	1,13
Refino Ox Lx	0,12	0,12	0,12	0,11	0,12
PLS Sf Lx	0,89	0,89	0,87	0,88	0,88
Refino Sf Lx	0,10	0,10	0,10	0,11	0,10
Bleed	2,20	2,20	2,24	2,26	2,23
SX					
PLS Ox	1,58	1,53	1,51	1,50	1,53
PLS Sf	0,94	0,94	0,90	0,89	0,92
Ref. Ox	0,06	0,05	0,04	0,05	0,05
Ref.Sf	0,05	0,05	0,04	0,05	0,05
ILS Ox a pila	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
ILS SF a pila	1,30	1,30	1,29	1,29	1,29
ILS Ox a pis	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
ILS SF a pis	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68

Flujo agua a refino	61	m3/h

PAD Ox

Cu Refino 0,12

Rec. 29-07		Q	Cu	Aporte	Módulos en Rampas	ILS Riego	ILS Drenaje
	P01	M001 M002	0	0,58	0,0		
	P02	M003 M004	0	0,76	0,0		
	P03	M005 M006	0	0,73	0,0		
	P04	M007 M008	0	0,70	0,0		
	P05	M009 M010	0	0,65	0,0		
88,2	P06	M011 M012	47	0,74	0,7		
47,4	P07	M013 M014	37	0,78	0,6		
74,1	P08	M015 M016	45	0,93	0,8		
64,1	P09	M017 M018	57	1,67	2,0		
83,5	P10	M019 M020	43	1,27	1,1		
100,3	P11	M021 M022	55	1,26	1,4		
76,2	P12	M023 M024	75	0,78	1,1		
68,8	P13	M025 M026	55	0,90	1,0		
78,6	P14	M027 M028	43	1,08	0,9		
64,3	P15	M029 M030	59	0,84	1,0		
53,0	P16	M031 M032	26	1,36	0,7		
90,4	P17	M033 M034	93	1,78	3,5		
83,3	P18	M035 M036	79	1,80	3,0		
76,3	P19	M037 M038	91	2,22	4,3		
71,1	P20	M039 M040	111	1,53	3,5		
46,6	P21	M041 M042	129	0,90	2,3		
53,3	P22	M043 M044	89	0,89	1,6		
70,5	P23	M045 M046	79	1,39	2,3		
34,3	P24	M047 M048	14	2,26	0,7		
	P25	M049 M050	0	0,71	0,0		
	P26	M051 M052	0	0,93	0,0		
	P27	M053 M054	0	0,65	0,0		
	P28	M055 M056	0	25,60	0,0		
	P29	M057 M058	0	0,74	0,0		
	P30	M059 M060	0	0,64	0,0		
	P31	M061 M062	0	0,54	0,0		
	P32	M063 M064	0	0,58	0,0		

Riego total 1228 — Aporte con refino 32,4
Riego-hum 1228 — Aporte a ILS 0,0
Aporte total Ox 32,4


PAD Sf

Cu Refino 0,10
Cu ILS a pila 1,29

Rec. 29-07		Q	Q ILS	Cu	Aporte	% Flujo a Bleed	Módulos en Rampas	ILS Riego	ILS Drenaje
49,5	P01	M001 M002	312		1,80	11,9	90		
50,2	P02	M003 M004	358		1,89	14,4	100		
36,4	P03	M011 M012	116		3,40	4,8	100	3	
	P04	M016 M017	37		0,73	0,0		5	
	P05	M021 M022	0		0,88	0,0		2	
	P06	M026 M027	0		0,90	0,0			
	P07	M031 M032	0		1,39	0,0			
	P08	M036 M037	0		1,73	0,0			
	P09	M041 M042	0		2,16	0,0			
	P10	M046 M047	0		1,78	0,0			
	P11	M051 M052	0		1,79	0,0			
	P12	M056 M057	0		1,14	0,0			
	P13	M061 M062	0		0,60	0,0			
	P14	M066 M067	0		0,66	0,0			
67,6	P15	M071 M072	151		0,80	2,4			
70,5	P16	M076 M080	246		0,71	3,4			
74,8	P17	M081 M085	129		0,76	1,9			
77,4	P18	M086 M090	397		0,98	7,9			
66,0	P19	M091 M095	169		0,51	1,6			
76,8	P20	M096 M100	304		0,76	4,5			
58,0	P21	M101 M105	187		0,95	3,6			
65,8	P22	M106 M110	0		0,96	0,0			
52,1	P23	M111 M115	367		0,85	6,2			
69,2	P24	M116 M120	341		0,72	4,7			
51,2	P25	M121 M125	375		1,56	12,3			
69,0	P26	M126 M130	460		0,69	6,1			
62,6	P27	M131 M135	396		0,81	6,3			
49,8	P28	M136 M140	284		1,38	8,2			

Riego total 4629 — 0
Riego -hum 4541 — Aporte con refino 100,2
Riego total - Q ILS 4541 — Aporte a ILS 0,0
Aporte total SF 100,2

Flujos de Parcelas Sulfuro (últimos 30 días)

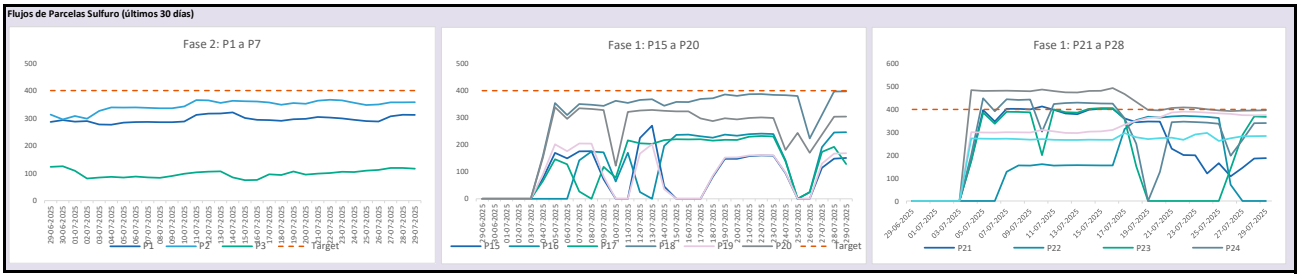

Flujos de Parcelas Oxido (últimos 30 días)

