viernes, 11-07-2025 07:00

Leaching

Aporte (ton Cu)

	Q	Cu	Aporte	Neto
Oxido	1536	1,72		64
Sulfuro	3346	1,13		90
Bleed	716	3,85		66
Aporte total	5599	3,93		220
Aporte				

SX-EW

Transferido (ton Cu)

	Q	Cu	Neto
Oxido	2398	2,44	135
Sulfuro	3400	1,12	84
Transferido Neto	5798	2,48	219

Piscinas

	Inventario m3	PLS %	ILS %	Δ 1 Refino %
Oxido	48439	33,69	26,1	82,7
Sulfuro	312708	70,10	88,2	76,2
Total	367.125	72%		

*Inventario máx. 509.000 m3

Análisis Químico

	12:00	18:00	00:00	06:00	día
Piscina					
PLS Ox. Lx	1,74	1,75	1,70	1,83	1,76
Refino Ox Lx	0,15	0,13	0,10	0,12	0,13
PLS Sf Lx	1,16	1,14	1,07	1,06	1,11
Refino Sf Lx	0,23	0,24	0,18	0,19	0,21
Bleed	4,06	3,94	3,92	3,85	3,94
SX					
PLS Ox	2,44	2,45	2,45	2,40	2,44
PLS Sf	1,14	1,14	1,10	1,10	1,12
Ref. Ox	0,10	0,10	0,05	0,09	0,08
Ref.Sf	0,10	0,10	0,06	0,10	0,09
ILS Ox a pila	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
ILS SF a pila	1,94	1,94	1,94	1,85	1,92
ILS Ox a pis	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
ILS SF a pis	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68

Flujo agua a refino: 94 m3/h

PAD Ox

Cu Refino 0,13

Rec 07-07		Q	Cu	Aporte	Módulos en Rampa	ILS Riego	ILS Drenaje
	P01 M001 M002	0	0,58	0,0			
	P02 M003 M004	0	0,76	0,0			
	P03 M005 M006	0	0,73	0,0			
	P04 M007 M008	0	0,70	0,0			
73,2	P05 M009 M010	0	0,65	0,0			
87,1	P06 M011 M012	36	0,87	0,6			
46,7	P07 M013 M014	40	1,09	0,9			
72,8	P08 M015 M016	46	1,32	1,2			
61,8	P09 M017 M018	58	1,84	2,3			
81,6	P10 M019 M020	46	1,46	1,4			
98,3	P11 M021 M022	51	1,51	1,6			
74,7	P12 M023 M024	73	0,91	1,3			
67,6	P13 M025 M026	57	1,17	1,3			
77,4	P14 M027 M028	46	1,20	1,1			
63,1	P15 M029 M030	59	1,10	1,3			
50,3	P16 M031 M032	27	1,82	1,0			
84,5	P17 M033 M034	86	2,30	4,2			
76,5	P18 M035 M036	73	3,30	5,2			
68,1	P19 M037 M038	94	3,20	6,6			
63,8	P20 M039 M040	122	3,12	8,2			
40,8	P21 M041 M042	131	1,42	3,8			
48,1	P22 M043 M044	94	1,53	3,0			
62,0	P23 M045 M046	120	1,91	4,8			
27,7	P24 M047 M048	20	3,44	1,5			
	P25 M049 M050	0	0,71	0,0			
	P26 M051 M052	0	0,93	0,0			
	P27 M053 M054	0	0,65	0,0			
	P28 M055 M056	0	25,60	0,0			
	P29 M057 M058	0	0,74	0,0			
	P30 M059 M060	0	0,64	0,0			
	P31 M061 M062	0	0,54	0,0			
	P32 M063 M064	0	0,58	0,0			

Riego total 1279 — Riego-hum 1279

Aporte con refino 51,4
Aporte a ILS 0,0
Aporte total Ox 51,4


PAD Sf


Cu Refino 0,21
Cu ILS a pila 1,92


Rec 07-07		Q	Q ILS	Cu	Aporte	% Riego a Bleed	Módulos en Rampa	ILS Riego	ILS Drenaje
41,5	P01 M001 M005	312		3,52	23,3	90			
40,3	P02 M009 M010	365		4,10	32,1	100			
25,6	P03 M011 M015	103		7,30	14,4	100	3		
	P04 M016 M020	0		0,73	0,0		1		
	P05 M021 M025	0		0,88	0,0				
	P06 M026 M030	0		0,90	0,0				
	P07 M031 M035	0		1,39	0,0				
	P08 M036 M040	0		1,73	0,0				
	P09 M041 M045	0		2,16	0,0				
	P10 M046 M050	0		1,78	0,0				
	P11 M051 M055	0		1,79	0,0				
	P12 M056 M060	0		1,14	0,0				
94,6	P13 M061 M065	132		0,93	2,1				
71,1	P14 M066 M070	0		0,66	0,0				
67,4	P15 M071 M075	0		0,90	0,0				
70,1	P16 M076 M080	170		1,03	3,1				
74,0	P17 M081 M085	216		1,12	4,4				
75,2	P18 M086 M090	355		1,26	8,4				
65,7	P19 M091 M095	0		0,76	0,0				
75,6	P20 M096 M100	321		0,98	5,6				
56,5	P21 M101 M105	398		1,06	7,6				
64,2	P22 M106 M110	154		1,05	2,9				
50,9	P23 M111 M115	400		0,96	6,8				
67,4	P24 M116 M120	423		0,93	6,9				
47,9	P25 M121 M125	304		1,99	12,2				
64,7	P26 M126 M130	400		1,03	7,4				
57,9	P27 M131 M135	480		1,23	11,0				
43,8	P28 M136 M140	267		2,34	12,8	50			

Riego total 4802 — 0
Riego -hum 4699 — Aporte con refino 161,2
Riego total - Q ILS 4699 — Aporte a ILS 0,0
Aporte total SF 161,2

Flujos de Parcelas Sulfuro (últimos 30 días)

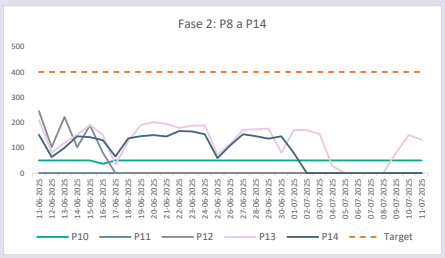

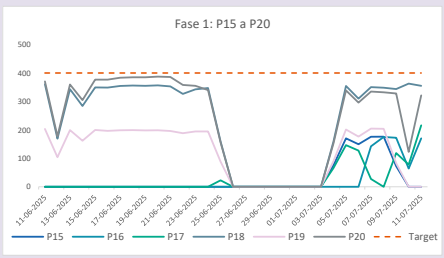

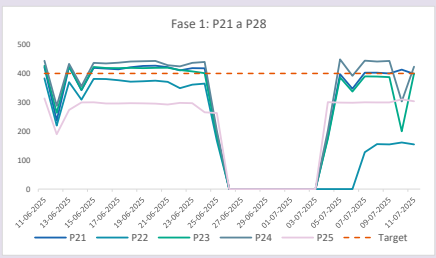

Flujos de Parcelas Oxido (últimos 30 días)

