lunes, 14-07-2025 07:00

Leaching

Aporte (ton Cu)

	Q	Cu	Aporte	Neto
Oxido	1067	1,55		40
Sulfuro	3956	1,10		105
Bleed	743	3,24		58
Aporte total	5766	3,50		202
Aporte				

SX-EW

Transferido (ton Cu)

	Q	Cu	Neto
Oxido	2400	2,24	124
Sulfuro	3400	1,12	85
Transferido Neto	5800	2,40	209

Piscinas

	Inventario m3	PLS %	ILS %	Δ -7 Refino %
Oxido	51219	35,85	39,4	73,6
Sulfuro	300996	67,84	86,5	73,2
Total	353.510	69%		

*Inventario máx. 509.000 m3

Análisis Químico

	12:00	18:00	00:00	06:00	día
Piscina					
PLS Ox. Lx	1,55	1,56	1,54	1,56	1,55
Refino Ox Lx	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
PLS Sf Lx	1,04	1,07	1,03	1,03	1,04
Refino Sf Lx	0,12	0,13	0,14	0,14	0,13
Bleed	3,28	3,24	3,26	3,26	3,26
SX					
PLS Ox	2,22	2,22	2,26	2,24	2,24
PLS Sf	1,13	1,13	1,09	1,12	1,12
Ref. Ox	0,09	0,09	0,08	0,08	0,08
Ref.Sf	0,08	0,08	0,08	0,07	0,08
ILS Ox a pila	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
ILS SF a pila	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
ILS Ox a pis	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
ILS SF a pis	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68

Flujo agua [-10.056] No Good Data Fc m3/h

PAD Ox

Cu Refino 0,10

Rec 07-07			Q	Cu	Aporte	Módulos en Rampale	ILS Riego	ILS Drenaje
	P01	M001 M002	0	0,58	0,0			
	P02	M003 M004	0	0,76	0,0			
	P03	M005 M006	0	0,73	0,0			
	P04	M007 M008	0	0,70	0,0			
73,2	P05	M009 M010	0	0,65	0,0			
87,1	P06	M011 M012	42	0,87	0,7			
46,7	P07	M013 M014	36	1,06	0,8			
72,8	P08	M015 M016	47	1,44	1,4			
61,8	P09	M017 M018	56	1,76	2,1			
81,6	P10	M019 M020	43	1,48	1,4			
98,3	P11	M021 M022	48	1,44	1,4			
74,7	P12	M023 M024	71	0,89	1,3			
67,6	P13	M025 M026	54	1,10	1,2			
77,4	P14	M027 M028	44	1,30	1,2			
63,1	P15	M029 M030	57	1,06	1,2			
50,3	P16	M031 M032	25	1,76	1,0			
84,5	P17	M033 M034	84	2,30	4,2			
76,5	P18	M035 M036	79	2,80	4,8			
68,1	P19	M037 M038	91	3,42	6,8			
63,8	P20	M039 M040	109	2,76	6,5			
40,8	P21	M041 M042	126	1,51	4,0			
48,1	P22	M043 M044	91	1,42	2,7			
62,0	P23	M045 M046	101	1,74	3,8			
27,7	P24	M047 M048	20	3,88	1,7			
	P25	M049 M050	0	0,71	0,0			
	P26	M051 M052	0	0,93	0,0			
	P27	M053 M054	0	0,65	0,0			
	P28	M055 M056	0	25,60	0,0			
	P29	M057 M058	0	0,74	0,0			
	P30	M059 M060	0	0,64	0,0			
	P31	M061 M062	0	0,54	0,0			
	P32	M063 M064	0	0,58	0,0			

Riego total	1227	Aporte con refino	48,3
Riego-hum	1227	Aporte a ILS	0,0
		Aporte total Ox	48,3


PAD Sf


Cu Refino 0,13
Cu ILS a pila 1,89


Rec 07-07			Q	Q ILS	Cu	Aporte	% Riego a Bleed	Módulos en Rampale	ILS Riego	ILS Drenaje
41,5	P01	M001 M005	321		3,24	22,5	90			
40,3	P02	M009 M010	363		3,54	27,9	100			
25,6	P03	M011 M015	84		6,04	11,2	100	3		
	P04	M016 M020	0		0,73	0,0		1		
	P05	M021 M025	0		0,88	0,0				
	P06	M026 M030	0		0,90	0,0				
	P07	M031 M035	0		1,39	0,0				
	P08	M036 M040	0		1,73	0,0				
	P09	M041 M045	0		2,16	0,0				
	P10	M046 M050	0		1,78	0,0				
	P11	M051 M055	0		1,79	0,0				
	P12	M056 M060	0		1,14	0,0				
94,6	P13	M061 M065	108		0,63	1,0				
71,1	P14	M066 M070	0		0,66	0,0				
67,4	P15	M071 M075	46		1,00	0,9				
70,1	P16	M076 M080	196		0,93	2,8				
74,0	P17	M081 M085	217		0,97	4,1				
75,2	P18	M086 M090	345		1,20	8,3				
65,7	P19	M091 M095	36		0,82	0,6				
75,6	P20	M096 M100	326		0,98	6,2				
56,5	P21	M101 M105	399		1,01	7,9				
64,2	P22	M106 M110	156		0,98	3,0				
50,9	P23	M111 M115	402		0,86	6,6				
67,4	P24	M116 M120	428		0,89	7,3				
47,9	P25	M121 M125	303		1,88	11,9				
64,7	P26	M126 M130	400		0,93	7,2				
57,9	P27	M131 M135	481		1,06	10,1				
43,8	P28	M136 M140	268		2,13	12,1				

Riego total	4877	0	
Riego -hum	4872	Aporte con refino	151,5
Riego total - Q ILS	4872	Aporte a ILS	0,0
		Aporte total SF	151,5

Flujos de Parcelas Sulfuro (últimos 30 días)

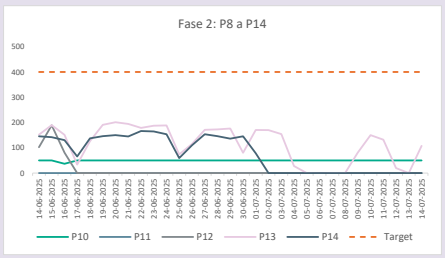

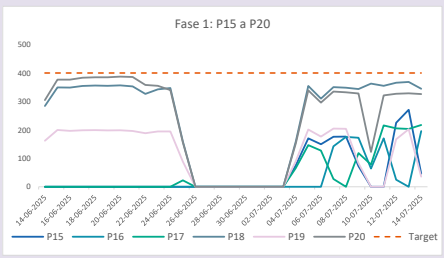

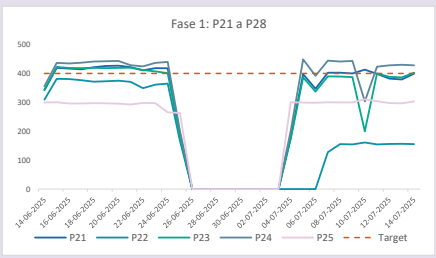

Flujos de Parcelas Oxido (últimos 30 días)

