miércoles, 16-07-2025 07:00

Aporte (ton Cu)

Leaching	Q	Cu	Aporte	Neto
Oxido	1077	1,43		37
Sulfuro	3864	1,05		97
Bleed	698	2,87		48
Aporte total	5639	3,23		182
Aporte				

Transferido (ton Cu)

SX-EW	Q	Cu	Neto
Oxido	2396	2,06	114
Sulfuro	3394	1,05	80
Transferido Neto	5790	2,30	194

Piscinas	Inventario m3	PLS %	ILS %	Δ -12 Refino %
Oxido	52574	32,61	43,2	77,4
Sulfuro	301736	68,69	85,1	74,9
Total	356.019	70%		

*Inventario máx. 509.000 m3

Análisis Químico	12:00	18:00	00:00	06:00	día
Piscina					
PLS Ox. Lx	1,41	1,46	1,43	1,40	1,42
Refino Ox Lx	0,15	0,17	0,18	0,15	0,16
PLS Sf Lx	0,99	0,99	1,01	0,98	0,99
Refino Sf Lx	0,15	0,15	0,13	0,12	0,14
Bleed	2,92	2,92	2,94	2,78	2,89
SX					
PLS Ox	2,09	2,10	2,03	2,02	2,06
PLS Sf	1,04	1,06	1,06	1,04	1,05
Ref. Ox	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Ref.Sf	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
ILS Ox a pila	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
ILS SF a pila	1,81	1,81	1,84	1,84	1,82
ILS Ox a pis	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
ILS SF a pis	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68

Flujo agua a refino	140	m3/h

PAD Ox

Cu Refino 0,16

Rec.14-07			Q	Cu	Aporte	M.Módulos en Rampas	ILS Riego	ILS Drenaje
	P01	M001 M003	0	0,58	0,0			
	P02	M004 M006	0	0,76	0,0			
	P03	M005 M006	0	0,73	0,0			
	P04	M007 M008	0	0,70	0,0			
73,3	P05	M009 M010	0	0,65	0,0			
87,5	P06	M011 M012	41	0,98	0,7			
47,0	P07	M013 M014	37	1,10	0,8			
73,5	P08	M015 M016	48	1,22	1,1			
62,8	P09	M017 M018	57	1,82	2,1			
82,4	P10	M019 M020	44	1,53	1,4			
99,2	P11	M021 M022	49	1,51	1,5			
75,4	P12	M023 M024	71	0,88	1,2			
68,2	P13	M025 M026	55	1,11	1,2			
77,9	P14	M027 M028	45	1,34	1,2			
63,7	P15	M029 M030	58	1,03	1,1			
51,5	P16	M031 M032	26	1,76	0,9			
87,0	P17	M033 M034	90	2,30	4,3			
81,9	P18	M035 M036	83	2,70	4,8			
71,8	P19	M037 M038	92	3,30	6,5			
67,5	P20	M039 M040	111	2,50	5,8			
43,8	P21	M041 M042	125	1,30	3,2			
50,9	P22	M043 M044	90	1,33	2,4			
67,0	P23	M045 M046	103	1,61	3,4			
31,5	P24	M047 M048	18	3,40	1,3			
	P25	M049 M050	0	0,71	0,0			
	P26	M051 M052	0	0,93	0,0			
	P27	M053 M054	0	0,65	0,0			
	P28	M055 M056	0	25,60	0,0			
	P29	M057 M058	0	0,74	0,0			
	P30	M059 M060	0	0,64	0,0			
	P31	M061 M062	0	0,54	0,0			
	P32	M063 M064	0	0,58	0,0			

Riego total 1242 — Aporte con refino **44,9**
Riego-hum 1242 — Aporte a ILS **0,0**
Aporte total Ox **44,9**


PAD Sf


Cu Refino 0,14
Cu ILS a pila 1,82


Rec.14-07			Q	Q ILS	Cu	Aporte	%Flujo a Bleed	M.Módulos en Rampas	ILS Riego	ILS Drenaje
44,8	P01	M001 M005	294		2,96	18,7	90			
44,4	P02	M006 M010	360		3,22	25,0	100			
30,1	P03	M011 M015	75		6,25	5,8	100	3		
	P04	M016 M020	4		0,73	0,0		2		
	P05	M021 M025	0		0,88	0,0				
	P06	M026 M030	0		0,90	0,0				
	P07	M031 M035	0		1,39	0,0				
	P08	M036 M040	0		1,73	0,0				
	P09	M041 M045	0		2,16	0,0				
	P10	M046 M050	0		1,78	0,0				
	P11	M051 M055	0		1,79	0,0				
	P12	M056 M060	0		1,14	0,0				
94,7	P13	M061 M065	137		0,70	1,7				
	P14	M066 M070	0		0,66	0,0				
67,3	P15	M071 M075	0		1,00	0,0				
70,1	P16	M076 M080	237		0,96	4,4				
74,2	P17	M081 M085	220		0,97	4,1				
75,9	P18	M086 M090	358		1,24	8,9				
65,8	P19	M091 M095	0		0,82	0,0				
76,0	P20	M096 M100	323		0,95	5,9				
57,1	P21	M101 M105	402		0,99	7,7				
64,5	P22	M106 M110	155		0,99	3,0				
51,5	P23	M111 M115	405		0,89	6,9				
68,1	P24	M116 M120	426		0,86	6,9				
48,9	P25	M121 M125	310		1,81	11,7				
65,9	P26	M126 M130	398		0,91	6,9				
59,6	P27	M131 M135	493		1,02	9,8				
46,1	P28	M136 M140	267		1,75	9,7				

Riego total 4866 0
Riego -hum 4867 — Aporte con refino **137,4**
Riego total - Q ILS 4867 — Aporte a ILS **0,0**
Aporte total SF **137,4**

Flujos de Parcelas Sulfuro (últimos 30 días)

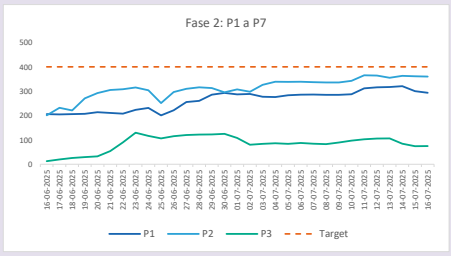

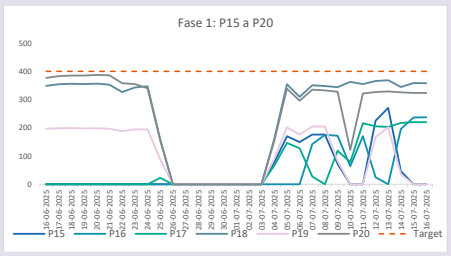

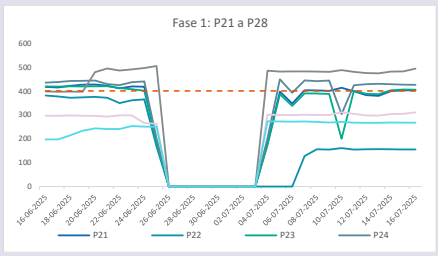

Flujos de Parcelas Oxido (últimos 30 días)

